


■ レール延伸

● 工事概要

レール工：L = 143.5 m

基礎工：鋼管杭 N = 38本 (φ700 L=12.0m~18.0m)

地盤改良：静的締固め砂杭 N = 415本 (φ700、φ400 L=10.0~12.5m)

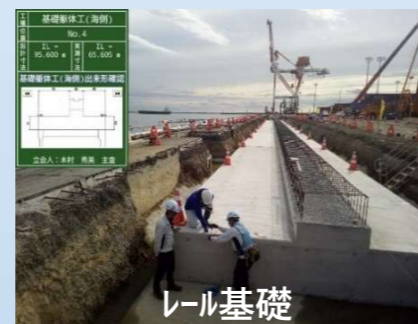

■ コンテナヤード舗装改良

● 工事概要

舗装改良：29,200㎡ (令和5年度まで約19,800㎡ (約67%))



小名浜港大剣ふ頭 ガントリークレーン供用式

事業経過報告資料



令和6年3月25日
福島県小名浜港湾建設事務所

■事業概要

小名浜港大剣ふ頭地区のコンテナターミナルにおいて、安定したコンテナ荷役を確保するため、ガントリークレーン建造、レール延伸及びコンテナヤード舗装改良により、コンテナターミナルの機能強化を実施しています。


●事業内容

- ①ガントリークレーン建造 N = 1基 (令和4～5年度)
- ②レール延伸 L = 143.5m (令和3～5年度)
- ③コンテナヤード舗装改良 A = 29,200㎡ (令和3～6年度)


●事業期間

令和3年度～令和6年度(予定)


《位置関係》

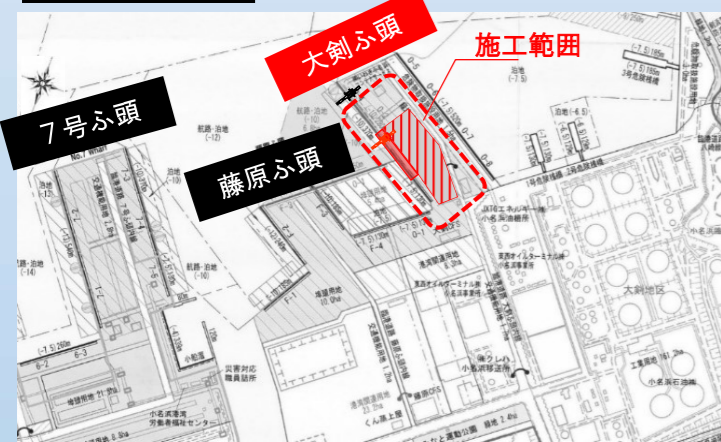

《大剣ふ頭全景》

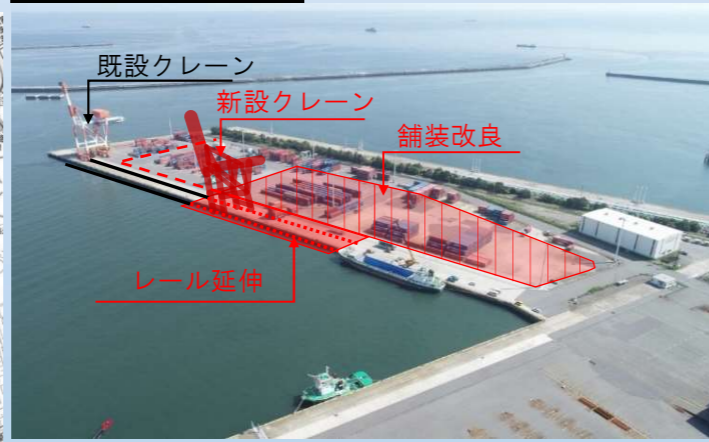

《概要図》

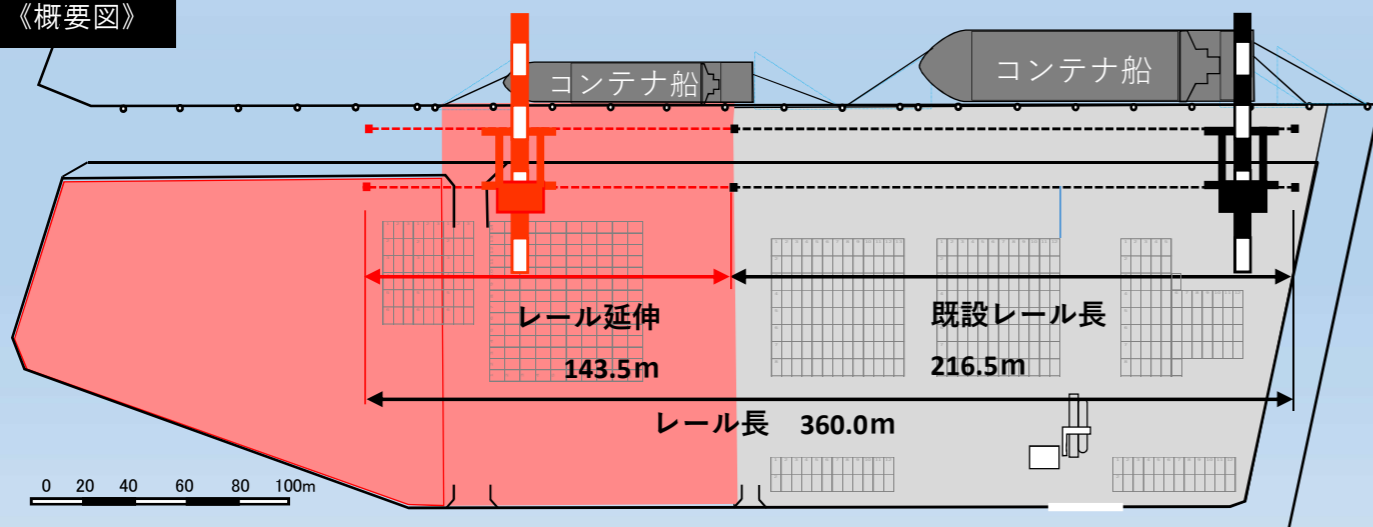

■ガントリークレーン建造

工事名：荷役機械建造工事（コンテナクレーン）

工事概要：コンテナクレーン製作・据付 N=1基

工期：令和4年10月～令和6年3月

受注者：株式会社三井E&S

●工事経過

令和5年 4月：クレーン製作開始

令和5年11月：クレーン製作完了

令和6年 1月：大剣ふ頭へ据付完了

令和6年 2月：落成検査（合格）

令和6年 3月：完成

《新設クレーン据付状況（R6.1.3）》



【ガントリークレーン概要】
形式：トロリ式橋形クレーン
全高：約82m
総重量：約740t
吊り上げ荷重：49.8t
